GRUNDFOS
SERVICE & SOLUTION

Telefon: 0212004100
e-mail: service-ro@grundfos.com

PIF-ID : _____

Proces verbal de asistenta punere in functiune
nr. 1 din 07.08.2026

Solicitant : AKRO Romania
Persoana contact : Alexandru Soare
Telefon : 0728994472
E-mail : alexandru.soare@akro.ro
Denumire sistem: Sistem alimentare cu apă demineralizare
Amplasament echipament: Stabilus Romania Srl
Persoana contact : George Boris, Alexandru Cipsian
Telefon : 0729165082, 0726350258
E-mail :
Localitate: Brașov
Nr. PIF contractate : 3 buc.
Conditii realizare PIF : DA [X] NU [ ] PARTIAL [ ]

Motivele pentru care nu s-a putut realiza PIF (se completeaza atunci cand nu se poate realiza PIF sau este realizat partial; daca este posibil vor fi documentate cu fotografii situatiile neconforme)	1.	Echipamentele nu sunt instalate/necorespunzator instalate	
	2.	Elemente de fixare, postamente, fundatii neconforme	
	3.	Nu exista apa in instalatii, in vederea realizarii testelor	
	4.	Lipsa tensiune de alimentare, cabluri electrice neconectate sau neconforme	
	5.	Nu este asigurat combustibil pt. actionarile cu motoare termice	
	6.	Conditii de lucru inadecvate (spatii neiluminate, inundate, etc.)	
	7.	Nu exista posibilitatea realizarii testelor functionale	
	8.	Nu sunt indeplinite conditiile de siguranta a muncii	
	9.	Nu este asigurat accesul sau accesul nu este posibil	
	10	Timp de asteptare pt. rezolvare deficiente 2 ore Ora start (HH:mm) _____ Ora stop (HH:mm) _____	
	11		
	12		

Finalizare PIF : Total 3 buc. Partial _____ buc.

- S-a verificat modul de instalare al echipamentelor, realizarea conexiunilor electrice [X]
- S-au realizat reglajele/setarile necesare parametrilor de lucru solicitati [X]
- S-au verificat sensurile de rotatie pentru pompele actionate electric [X]
- S-au facut probe functionale [X]
- Personalul executant a fost instruit in ceea ce priveste modul de exploatare si reglarea parametrilor de lucru [X]
- Echipamentele au fost insotite la livrare, de instructiuni de exploatare minimale ce trebuiesc urmarite de personalul de exploatare si intretinere al beneficiarului [X]
- Echipamentele raman functionale la dispozitia beneficiarului — DA [X] NU [ ] PARTIAL [ ]
- Se ataseaza prezentului proces verbal fise individuale de verificare, liste, anexe etc. — DA [X] NU [ ] PARTIAL [ ]
- Observatii — DA [X] NU [ ] PARTIAL [ ]

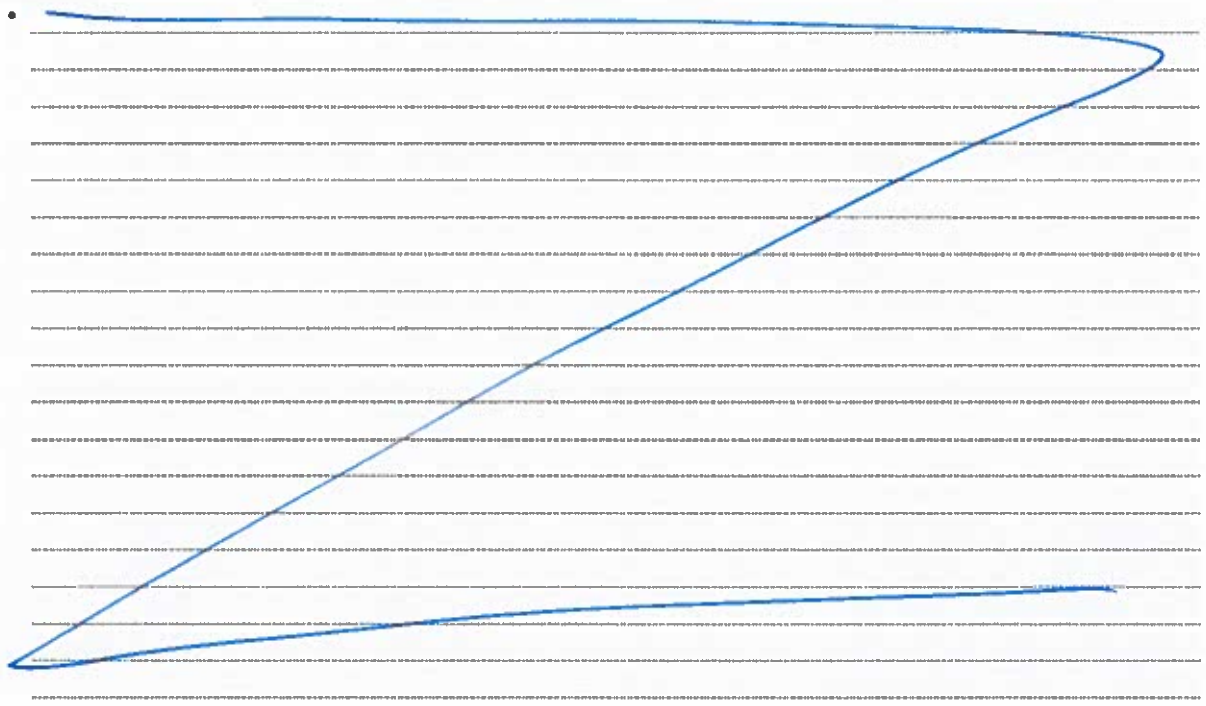
* Eventualele observatii sunt specificate in pag. 2 al prezentului proces verbal sau in fisele, anexele, atasate.

GRUNDFOS
SERVICE & SOLUTION

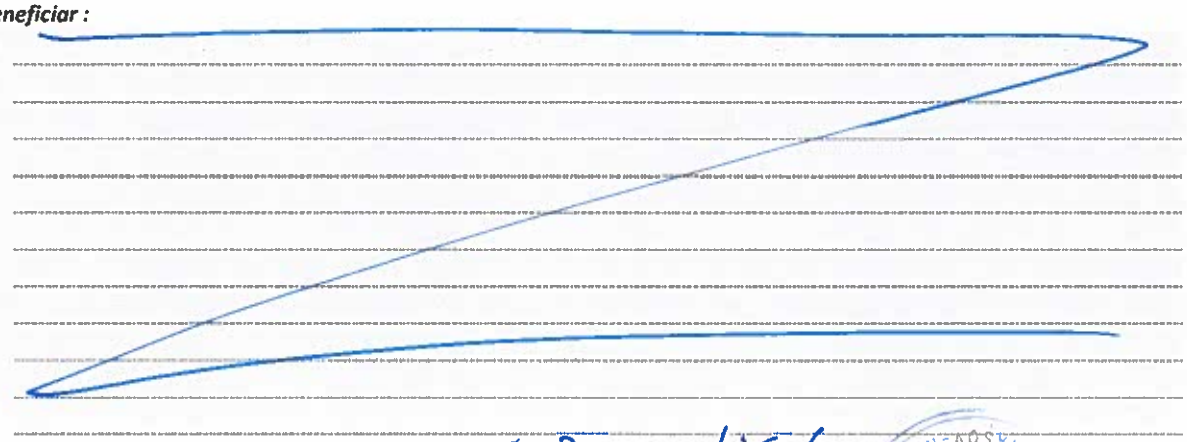
Telefon: 0212004100
e-mail: service-ro@grundfos.com

Observatii la Proces verbal de asistenta punere in functiune
nr. 1 din 07.08.2026

Executant :

- 

Beneficiar :

- 

Semnaturi :

Reprezentant	Grundfos Pompe Romania	SC Recondi Sst Cristi Popa	
Reprezentant			
Reprezentant			

GRUNDFOS
SERVICE & SOLUTION

Telefon: 0212004100
e-mail: service-ro@grundfos.com

PIF-ID :

Fisa de verificare individuala nr. 1

Executant		Nume tehnician	Tipul interventiei	
Tehnician Grundfos			Inspectie	
Tehnician Grundfos ASP	X	Cristi Popa	Verificare	
Tehnician Grundfos SP			Punere in functiune	X

A. Date sistem pompare :

Gruparea sistemului :		Nr. Total pompe	Nr. pompe principale	Nr. pompe secundare
Pompa individuala	X	3	2	1
Grup pompare				

B. Identificarea individuala a pompelor (daca este posibil) :

	Tip pompe	Cod produs	Serie produs	Pc (yyww)
P1	CRIE5-9 MP-A-E-HQQE	93147604	10000005	2625
P2	CRIE5-9 M-P-A-E HQQE	93147604	10000003	2625
P3	CRIE5-9 M-P-A-E HQQE	93147604	10000004	2625
P4				
P5				
P6				

Date nominale

Pompe principale : Q= 7,2 m3/h H= 71,7 m

Pompe secundare : Q= 7,2 m3/h H= 71,7 m

C. Identificarea individuala a motoarelor (daca este posibil) :

Tip motoare pompe principale	Cod produs	DE	NDE	P_{nom} [kW]
MGE90LD2-FT115	98190193	6305	6204	2,2
Tip motoare pompe secundare	**Cod produs**	**DE**	**NDE**	**P_{nom} [kW]**
Parametrii nominali:	**1Ph / 3 Ph**	**Tensiune [V]**	**Curent [A]**	**Protectii motor**
Pompele principale :	3	400	4,2	
Pompele secundare :	3	400	4,2	

Protectii motor :

1	Klixon (contact termic)	3	PT 100/1000 bobinaj	5	Senzor de umiditate	7	MP 204
2	PTC (Thermistor)	4	PT 100/1000 rulmenti	6	Senzor de apa in ulei	8	Tempcon

D. Tablou electric :

Grundfos standard		Grundfos nonstandard		Non Grundfos			
		Modul de comunicatie		Acumulator			
Mediul de instalare :	Interior		Exterior		Ventilatie		Incalzire	
Mod de pornire :	DOL		SD		Soft starter		VFD	
Producator :	—				Serie sau ID :			
Descriere sau tip :					Pc (yyww) :			
Cod produs :					Serie Controler :			
Tip Controler :	CU 352 / Multi-S		CU 300 / CS 1000		CU 301 / CUE		Multi-E	

E. Starea instalatiei :

E1. Pompe		n.a.	Not	Not OK	OK	Obs
1	Montaj corespunzator al echipamentului (fixare, fundatii etc.)				X	
2	Conectare la instalatie, compensatoare de montaj, elemente de sustinere etc.				X	
3	Conditii de aspiratie corespunzatoare, dimensionare conducte etc.				X	

GRUNDFOS
SERVICE & SOLUTION

Telefon: 0212004100
e-mail: service-ro@grundfos.com

E. Starea instalatiei :		n.a.	Not	Not OK	OK	Obs
E1. Pompe						
4	Nivel vibratii rulmenti sau lagare				X	
5	Nivel temperatura rulmenti sau lagare				X	
6	Nivel general de zgomot				X	
7	Etansare mecanica				X	
8	Corpul pompei & garnituri				X	
9	Flansele pompei & garnituri				X	
10	Conditii generale pompa				X	
E2. Cuplaje mecanice						
1	Aliniere (daca este cazul) DA ☐ NU ☐					
E3. Motoare & tablou electric						
1	Cabluri electrice de alimentare (instalare, conectare, protectie mecanica, PG)				X	
2	Cabluri electrice de forta motor (instalare, conectare, protectie mecanica, PG)				X	
3	Cabluri electrice de comanda (instalare, conectare, protectie mecanica, PG)				X	
4	Instalatia de impamantare				X	
5	Tablou electric montat corespunzator				X	
6	Conexiuni electrice realizate				X	
7	Directia de rotatie				X	
8	Vibratii sau zgomote anormale				X	
9	Incalzire excesiva in functionare				X	
E4. Accesorii						
1	Circuit Refulare — Presostat ☐ — Traductor ☒					
2	Circuit Aspiratie — Plutitor Electrozi ☒ — Presostat ☐ — Traductor ☒					

		Pres.1	Pres.2	Pres.3	Pres.4	Pres.5	Pres.6	Setpoint
3	Pres. START [bar] :							7,5
	Pres. STOP [bar] :							

E5. Conditii generale						
1	Conditii generale de instalare (postament, conducte, echipamente, accesorii)				X	
2	Conditii camera pompelor (iluminare, temperatura, umiditate)				X	
3	Conditii de interventie sau mentenanta (acces, spatiu, sisteme de ridicare etc.)				X	
4	Recipient cu membrana				X	

Observatii / constatari :

Recomandam limitarea debitului consumat de instalatie conform curbei pompei

Semnaturi :

Reprezentant Grundfos Pompe Romania — SC Reconti Srl Cristi Popa

n.a. = Nu s-a analizat	Not OK = Conditii neconforme	Obs. = Observatii
Not = Nu este cazul	OK = Conditii conforme	
